
吉木萨尔县住房和城乡建设局

财政支出绩效评价报告

项目名称：市政安全维护资金项目

预算单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

实施单位：吉木萨尔县住房和城乡建设局

委托单位：吉木萨尔县财政局

评价机构：新疆高博有限责任公司会计师事务所

主 评 人：何玉铨

2022 年 8 月

目 录

一、 基本情况 1

 （一） 项目概况 1

 （二） 绩效目标 8

二、 绩效评价工作开展情况 9

 （一） 绩效评价目的、对象和范围 9

 （二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 10

 （三） 绩效评价工作过程 11

三、 综合评价情况及评价结论 13

四、 绩效评价指标分析 14

 （一） 决策情况 14

 （二） 过程指标 16

 （三） 产出情况 17

 （四） 效益情况 18

五、 存在的问题 19

六、 有关建议 20

 附件 1：市政安全维护资金项目支出绩效评价指标综合评价表 22

 附件 2：市政安全维护资金项目明细表 31

附件 3 ： 满意度调查结果分析 33

附件 4 ： 现场勘查调研36

吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金 项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任公司会计师事务所受吉木萨尔县财政局的委托，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，于 2022 年 7 月 25 日至 8 月 20 日，开展 2021 年度吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目（以下简称“该项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了保障市政基础设施安全正常运行，吉木萨尔县住房和城乡建设局从 2018 年至 2021 年对 9 个项目进行工程安全维护，从而提高城市安全指数，提升县城居民生活幸福感。结合实际情况，实施该项目。

2. 主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

市政安全维护资金项目共包含 9 个项目，其中 2021 年当年实施的有 4 个，其余为支付 2018 年至 2020 年度工程尾款。详细见《市政安全维护资金项目明细表》（附件 2），9 个项目列示如下：

项目 1：2018 年 8 月 24 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局和吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司签订建设工程施工合同。计划 2018 年 8 月 15 日开工，2018 年 8 月 30 日竣工，工期 15 天。建设内容为：

①人工清理、保养消防栓共计 186 个，安装 DN200 电熔套管 20 个。

②更换消防井盖(球墨铸铁) 16 个，安装消防标识牌 29 个，安装消火栓共计 27 个。

③砌筑消防井 13 座安装、迁移消防水鹤 2 组等工程内容。

项目 2：2019 年 2 月 2 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局和新疆昌吉市政建设（集团）有限公司签订道路硬隔离栏安装合同，建设内容为满城路道路硬隔离栏安装，工期 14 天。

项目 3：2019 年 7 月 16 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局和新疆瑞丰恒艺广告有限公司签订市政维护项目合同协议书，合同内容为东关街历史街区围挡修复，计划 2019 年 7 月 1 日开工，2019 年 7 月 14 日竣工，工期 14 天。

项目 4：2019 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局和新疆隆河市政工程有限公司签订吉木萨尔县环岛安装交通信号灯采购合同。建设内

容为信号灯、安装、调试、售后维修。工期 30 天。

项目 5：2020 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局和扬州市松佳照明电器有限公司签订市政维护项目合同协议书，建设内容为道路路灯维修。计划工期：2020 年 10 月 30 日开工 2020 年 12 月 30 日竣工，共 60 天。

项目 6：2021 年 1 月，吉木萨尔县住房和城乡建设局和新疆东方恒元信息技术有限公司签订吉木萨尔县 5 岔环岛路口新增红绿灯工程。约定合同签订后 20 个工作日内完工。

项目 7：2021 年 11 月 26 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局和新疆华庭工贸有限公司签订合同，合同内容为北庭商贸城步行街 50 套防撞隔离花箱的安装。

项目 8：2020 年 4 月 20 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局和吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司签订合同，计划 2020 年 4 月 22 日开工，2021 年 4 月 21 日竣工，工期 365 天，合同内容为吉木萨尔县城内消防栓、消防水鹤及消防井维护等。

项目 9：2021 年，吉木萨尔县住房和城乡建设局和吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司签订县城公共区域增设停车位标示线施工合同，工期要求自 2021 年 6 月 12 日开工至 2021 年 7 月 12 日竣工。

(2) 项目实施情况

项目 1：2021 年 8 月 10 日，吉木萨尔县政府采购中心对城消防设施维护保养安装工程进行公开招标，确定中标单位为吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司，中标金额为 381,726.44 元。根据新疆韵德恒益

工程项目管理咨询有限公司出具的审计报告显示：核定工程竣工结算 379,243.32 元。工程款已支付 36.9 万元，剩余未支付 1.02 万元。根据政府采购集中采购项目验收报告单显示，2018 年 9 月 6 日对吉木萨尔县城消防设施维护保养安装工程进行验收。

项目 2：2019 年 1 月 29 日，吉木萨尔县政府采购中心对吉木萨尔县满城路道路硬隔离栏工程进行公开招标，确定中标公司为新疆昌吉市政建设（集团）有限公司，中标金额为 1311370.04 元。工程于 2019 年 4 月完工，根据《吉木萨尔县满城路道路硬隔离栏工程结算审查报告》宏昌咨询字〔2021〕第 00648 号显示核定工程竣工结算 782,580.03 元。已支付 70.79 万元，剩余未支付 7.468 万元。根据政府采购集中采购项目验收报告单显示，2019 年 4 月对吉木萨尔县满城路道路硬隔离栏进行验收。

项目 3：2019 年 6 月 27 日，根据政府采购询价成交通知（备查表）显示：中标单位为新疆瑞丰恒艺广告有限公司，中标价格为 17 万元，工程于 2019 年 7 月 25 日完工。2020 年 11 月 22 日，根据新疆玖一建设工程管理咨询公司出具的关于东关街历史街区围挡修复项目结算审核报告显示：经建设单位、施工单位、审核单位共同鉴定确认审定工程结算造价为 17.01 万元。已支付 5.1 万元，剩余未支付 11.91 万元。根据政府采购集中采购项目验收报告单显示，2019 年 7 月 25 日，对东关街历史街区围挡修复项目进行验收。

项目 4：根据 2019 年 12 月 31 日吉木萨尔县环岛安装交通信号灯项目中标通知书显示：中标公司为新疆隆河市政工程有限公司，中

标金额为 278,720 元。根据新疆垚森工程造价咨询有限公司出具的竣工结算审核报告显示结算审定价为 278,720 元。已支付 10 万元，剩余未支付 17.872 万元。已完成验收并交付使用。

项目 5：根据政府采购询价成交通知书（备查表）显示：成交单位为扬州市松佳照明电器有限公司，成交价 266,820 元，根据新疆正昊建设工程项目管理有限公司出具的《吉木萨尔县 2020 年道路路灯维修项目结算审查报告》显示：工程报审结算价款为 300,665 元。已支付 8.01 万元，剩余未支付 22.565 万元。根据政府采购集中采购项目验收报告单显示，2021 年 1 月 18 日，对吉木萨尔县 2020 年道路路灯维修项目进行验收。

项目 6：2021 年 1 月 27 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局通过政府采购询价确定吉木萨尔县 5 岔环岛路口新增红绿灯工程中选单位为新疆东方恒元信息技术有限公司，成交价 23.6 万元。根据新疆正祥建设工程项目管理咨询有限公司出具的《吉木萨尔县 5 岔环岛路口新增红绿灯工程结算审核报告》显示工程结算造价为 23.6 万元。

项目 7：2021 年 11 月 23 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局确认新疆华庭工贸有限公司为供应商，成交金额为 8.5 万元。2021 年 12 月 7 日，50 套防撞花箱项目通过验收。

项目 8：2020 年 4 月 21 日，关于吉木萨尔县市政公共配套设施维护项目-消防设施维护吉木萨尔县住房和城乡建设局与吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司确定成交工程价格为 42.7 万元。2021 年 5 月 6 日，对吉木萨尔县市政公共配套设施维护项目-消防设施维护进

行验收。2021 年 7 月，由新疆垚森工程造价咨询有限公司出具的《吉木萨尔县 2020 年市政公共设施维护项目-消防设施维护竣工结算审核报告》显示竣工结算价款为 411,989.91 元。已支付 12.7 万元，剩余未支付 28.5 万元。

项目 9：2021 年 7 月 10 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局通过政府采购询价确定吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司为吉木萨尔县县域公共区域增设停车位标示线项目的中标单位，成交价 19.88 万元。

3. 资金投入和使用情况

2021 年 12 月 22 日，吉木萨尔县住房和城乡建设局向中共吉木萨尔县委财经委员会申请拨付市政安全维护项目资金，2021 年 12 月 22 日，财经委员会文件批阅单显示同意拨付 125 万元用于市政安全费用支付。2021 年 12 月 28 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式支付 125 万资金，明细如下：

项目 1：2021 年，吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 1.02 万元。2021 年 12 月 28 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司支付 1.02 万元。

项目 2：2021 年 12 月 23 日，新疆昌吉市政建设（集团）有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 74,680.03 元，吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 74,680.03 元，2021 年 12 月 28 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向新疆昌吉市政建设（集

团)有限公司支付 74,680.03 元。

项目 3: 2021 年,新疆瑞丰恒艺广告有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 11.91 万元,吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 11.91 万元,2021 年 12 月 28 日,吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向新疆瑞丰恒艺广告有限公司支付 11.91 万元。

项目 4: 2021 年 12 月 21 日,新疆隆河市政工程有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 17.872 万元。吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 17.872 万元。2021 年 12 月 28 日,吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向新疆隆河市政工程有限公司支付 11.91 万元。

项目 5: 2021 年 12 月 24 日,扬州市松佳照明电器有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 22.565 万元。吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 22.565 万元。2021 年 12 月 28 日,吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向新疆隆河市政工程有限公司支付 22.565 万元。

项目 6: 2021 年 12 月 22 日,新疆东方恒元信息技术有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请第 1 期工程款 13.6 万元。吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 13.6 万元。2021 年 12 月 28 日,吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向新疆隆河市政工程有限公司支付 13.6 万元。

项目 7: 2021 年 12 月 22 日,新疆华庭工贸有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 8.5 万元。吉木萨尔县住房和城乡建设局

设局同意支付 8.5 万元。2021 年 12 月 28 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向新疆隆河市政工程有限公司支付 8.5 万元。

项目 8：2021 年 12 月 23 日，吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请工程款 27.522 万元。吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 27.522 万元。2021 年 12 月 28 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司支付 27.522 万元。

项目 9：2021 年，吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司向吉木萨尔县住房和城乡建设局申请支付部分工程款 150,515 元，吉木萨尔县住房和城乡建设局同意支付 15.0515 元。2021 年 12 月 28 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司支付 15.0515 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目预算执行 125 万元，预算执行率 100%。

（二）绩效目标

1.年度总体目标

吉木萨尔县住房和城乡建设局设置的年度总体目标如下：为了保障市政基础设施安全正常运行，市政安全维护工程对 2018 年至 2021 年等 9 个项目已完成工程安全维护，以上 9 个项目审计均已完成，拨付市政安全维护工程款 125 万元。

2.具体绩效指标

2021 年吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目资

金总额 125 万元。住建局共设置了三个一级指标，明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	涉及安全项目个数	≥9 个
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	资金及时支付率	=100%
	成本指标	本年支付项目款金额	≤125 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	审计建议采纳率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	综合利用率	≥95%
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：一是通过此次绩效评价，了解和掌握吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为同类项目资金投入、分配和管理提供决策参考依据。

评价对象和评价范围:对吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价是对项目进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理 and 项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为四个一级指标，一级指标下设 10 个二级指标、17 个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见《吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

3. 评价方法

本次绩效评价方法主要采用了比较法、公众评判法、文献法。

比较法：通过梳理市政安全维护资金项目资金预算情况与预算执行情况，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对吉木萨尔县住房和城乡建设局进行充分调研，了解掌握资金分配、资金

管理、资金使用、制度建设、制度执行等情况。采用问卷调查方式，对项目开展“吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目满意度”调查，评价项目资金产生的社会效益及满意度，评价项目对保障市政基础设施安全正常运行，提高基础设施的综合利用率，改善城市安全指数，提升县城居民生活幸福感与受益群众满意度情况。

文献法：通过检索、查阅、梳理该项目的政策文件、研读《关于拨付市政安全维护资金的请示》吉县建字〔2021〕194号、中共吉木萨尔县委财经委员会文件批阅单等文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。通过梳理吉木萨尔县住房和城乡建设局项目管理等制度落实情况，研读《吉木萨尔县住房和城乡建设局财务管理制度》《吉木萨尔县住房和城乡建设局“三重一大”决策制度》等相关材料，评价项目管理制度健全性及制度执行有效性。

4. 评价标准

该项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

吉木萨尔县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专

业第三方机构，成立绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

(1) 文件研读

评价小组在吉木萨尔县财政局、吉木萨尔县住房和城乡建设局全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，组织评价小组成员对项目相关文件进行研读。根据财预〔2020〕10号文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系初稿。

(2) 前期调研

根据绩效评价工作开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施、资金的管理等情况，并且讨论了绩效评价指标体系的可行性。

(3) 确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，确定项目绩效评价指标体系，设置一级指标共4个，包括决策（20%）、过程（20%）、产出（40%）、效益（20%）四类指标；主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目决策、项目执行到实施效益、效果的逻辑路径。通过现场查看、问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

2. 组织实施

评价小组通过与吉木萨尔县住建局沟通，了解项目基本情况，收

集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

3. 综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求吉木萨尔县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。经对吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分86.56分，绩效等级为“良”。该项目的执行保障了市政基础设施安全正常运行，提高了基础设施的综合利用率，对改善城市安全指数，提升县城居民生活幸福感具有重要的推动作用。具体得分率及评分情况见下表：

吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目

绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	17.00	85.00%
过程指标	20.00	18.00	90.00%
产出指标	40.00	34.78	86.95%
效益指标	20.00	16.78	83.90%
合计	100.00	86.56	86.56%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 17 分）

1. 项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目依据吉木萨尔县住房和城乡建设局向吉木萨尔县委财经委员会提交《关于拨付市政安全维护资金的请示》和县委财经委员会文件批阅单等文件设立，符合吉木萨尔县市政基础设施的实际情况。通过查看住建局部门职责文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目自 2021 年开始实施，经中共吉木萨尔县委财经委员会集体决策，按照规定程序设立，审批文件和材料完整，立项程序合规。

该指标得 2 分。

综上，项目立项得 5 分。

2. 绩效目标（分值 5 分，得分 2 分）

（1）绩效目标合理性（分值 2 分，得分 1 分）

该项目工作任务目标明确，2021 年绩效目标经吉木萨尔县住房和城乡建设局、吉木萨尔县财政局及吉木萨尔县人大批复。绩效目标的设置与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目目标与预算确定的项目资金量相匹配。该项目设置社会效益指标为“审计意见采纳”，不够科学合理，该项目是市政基础设施建设，主要的社会效益应当是：提升城区的市政基础设施硬件条件，更好保障了城市运行安全，为周边市民生产生活与出行提供便捷等。该指标扣 1 分，得 1 分。

（2）绩效指标明确性（分值 3 分，得分 1 分）

该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目绩效目标与项目计划数相对应，但数量指标仅设置“涉及安全项目个数”指标，未设置支付往年工程款项目数量以及 2021 年新建项目数量，不够明确细化，成本指标以预算数直接列示，未进行细化。该指标扣 2 分，得 1 分。

综上，绩效目标得 3 分。

3. 资金投入（分值 10 分，得分 10 分）

（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 5 分）

该项目预算由吉木萨尔县住建局编制预算草案，由县财政局进行

审核，提出修改意见，最后由县人大批准预算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，该指标得 5 分。

(2) 资金分配合理性（分值 5 分，得分 5 分）

吉木萨尔县住房和城乡建设局依据多家施工方的申请将 125 万元分配到 9 个项目上，与批复的预算额度和实际情况相符。资金分配依据充分，资金分配额度合理，且与项目实际相适应。该指标得 5 分。

综上，资金投入得 10 分。

(二) 过程指标（分值 20 分，得分 18 分）

1. 资金管理（分值 15 分，得分 15 分）

(1) 资金到位率（分值 5 分，得分 5 分）

该项目预算资金 125 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位 125 万元，资金到位率 100%。该指标得 5 分。

(2) 预算执行率（分值 5 分，得分 5 分）

该项目预算资金 125 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金执行 125 万元，预算执行率 100%。该指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性（分值 5 分，得分 5 分）

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，未发现违规使用情况。该指标得 5 分。

综上，资金管理得 15 分。

2. 组织实施（分值 5 分，得分 3 分）

(1) 管理制度健全性（分值 2 分，得分 1 分）

通过查看《吉木萨尔县住房和城乡建设局财务管理制度》《吉木萨尔县住房和城乡建设局“三重一大”决策制度》等制度文件，住建局财务管理制度健全，为项目资金支付和重大项目决策、大额资金使用提供了保障，未见政府采购制度、项目管理制度和预算绩效业务管理制度。该指标扣 1 分，得 1 分。

(2) 制度执行有效性（分值 3 分，得分 2 分）

吉木萨尔县住建局依据《吉木萨尔县住房和城乡建设局财务管理制度》《吉木萨尔县住房和城乡建设局“三重一大”决策制度》等制度文件对该项目进行财务和项目管理，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。部分项目未按照合同及时支付资金，该指标扣 1 分，得 2 分。

综上，组织实施得 3 分。

(三) 产出情况（分值 40 分，得分 34.78 分）

1. 产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

实际完成率

根据住建局提供的 9 个项目的审计和审核报告以及盖章资料显示：9 个项目均已完工，125 万工程款已支付完成，实际完成数量和合同一致，实际完成率 100%，得 10 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

2. 产出质量（分值 10 分，得分 7.78 分）

质量达标率

根据住建局提供的项目资料，其中项目 6 和项目 9 无验收单，占 9 个项目的比重为 22.22%，按比例扣分，该指标扣 2.22 分，得 7.78 分。

综上，产出质量指标得 7.78 分。

3. 产出时效（分值 10 分，得分 7 分）

完成及时性

根据住建局提供的项目资料，包括 9 个审计和审核报告、资金支付凭证显示：工程及时完工，部分项目未按照合同及时支付资金，该指标扣 3 分，得 7 分。

综上，产出时效指标得 7 分。

4. 产出成本（分值 10 分，得分 10 分）

成本节约率

该项目实际成本共计 125 万元，与预算数 125 万元相比节约 0 万元，实际成本等于计划成本，未超出预算金额。得 10 分。

综上，产出成本指标得 10 分。

（四）效益情况（分值 20 分，得分 16.78 分）

1. 社会效益指标（分值 10 分，得分 9.19 分）

根据住建局提供的盖章资料显示：通过实施该项目，城市安全指数和基础设施综合利用率有效提升，居民生活条件得到改善。

评价小组通过发放“吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目满意度调查问卷”，对项目保障市政基础设施安全正常运行

进行调查分析，评价项目实施产生的社会效益，评价小组共收回 100 份问卷，其中 1 份为无效问卷，剩余 99 份问卷中：15 份问卷满意度为非常满意、44 份为满意、32 份为比较满意、8 份为不满意，未见非常不满意情况。按照不满意所占比例扣分，扣 $(8/99 \times 100\%) \times 10 = 0.81$ 分，得 9.19 分。

综上，社会效益指标得 9.19 分。

2. 满意度指标（分值 10 分，得分 7.59 分）

受益群众满意度

评价小组通过发放“住房和城乡建设局市政安全维护资金项目满意度调查问卷”，对受益群众满意度进行调查分析，评价小组共发放 100 份问卷，收回的 100 份中其中 1 份为无效问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照调查问卷中第 5 题的回复情况及满意度计算公式得知，受益群众满意度为 75.9%，即 $= (13 \times 1.0 + 39 \times 0.9 + 41 \times 0.6 + 6 \times 0.4) / 99 \times 100\%$ ，满意度不足 100%，扣 2.41 分，得 7.59 分。

综上，满意度指标得 7.59 分。

五、存在的问题

（一）绩效指标的设置不够科学合理

吉木萨尔县住建局根据项目内容设置了绩效目标，绩效指标的设置符合量化的要求，但存在部分绩效指标的设置不合理的问题：该项

目设置社会效益指标为“审计意见采纳”，不够科学合理，该项目是市政基础设施建设，主要的社会效益应当是：提升城区的市政基础设施硬件条件，更好保障了城市运行安全，为周边市民生产生活与出行提供便捷等。

数量指标仅设置“涉及安全项目个数”指标，未设置支付往年工程款项目数量以及 2021 年新建项目数量，不够明确细化，成本指标以预算数直接列示，未进行细化。

（二）项目预算绩效业务管理制度不健全

在评价过程中，经对住建局进行资料收集和现场查看，未见住建局预算绩效业务管理制度，未能为绩效工作提供制度保障。

（三）项目资金支付不及时

通过对比各项目合同和资金支付凭证，吉木萨尔县住建局存在未严格按照合同付款，部分项目在质保期过后未按期支付工程尾款的现象。

六、有关建议

（一）加强绩效目标编制培训，强化目标审核

建议住建局加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不准确的绩效目标应及时退回相关部门，并要求进行进一步修改完善，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。在开展绩效监控、绩效自评工作时，填报人员应与项目负责人充分沟通，准确了解填报项目

实际情况，做到数据准确。

（二）进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化资金过程监督和现场核查

建议住建局建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确。同时，住建局要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

（三）完善工程款支付审批流程，严格按工程实施进度和合同约定支付工程价款

吉木萨尔县住建局应完善工程款支付审批流程，严格按工程实施进度和合同约定支付工程价款；加强对工程款支付的监督、管理，定期核查工程款的支付情况。

附件 1：吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目绩效评价综合评分表

附件 2：市政安全维护资金项目明细表

附件 3：满意度调查结果分析

附件 4：现场勘查调研

附件 1：吉木萨尔县住房和城乡建设局市政安全维护资金项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	该项目依据吉木萨尔县住房和城乡建设局向吉木萨尔县委财经委员会提交《关于拨付市政安全维护资金的请示》和县委财经委员会文件批阅单等文件设立，符合吉木萨尔县市政基础设施的实际情况。通过查看住建局部门职责文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。该指标得 3 分。		3
					①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和相关政策；得 1 分			
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分			
					③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 1 分			
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；得 0.5 分	该项目自 2021 年开始实施，经中共吉木萨尔县委财经委员会集体决策，按照规定程序设立，审批文件和材料完整，立项程序合规。该指标得 2 分。		2
					评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分 ②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5 分			
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	该项目工作任务目标明确，2021 年绩效目标经吉木萨尔县住房和城乡建设局、吉木萨尔县财政局及吉木萨尔县人大批复。绩效目标的设置与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目目标与预算确定的项目资金量相匹配。该项目设置社会效益指标为“审计意见采纳”，不够科学合理，该项目是市政基础设施建设，主要的社会效益应当是：提升城区的市政基础设施硬件条件，更好保障了城市运行安全，为周边市民生产生活与出行提供便捷等。该指标扣 1 分，得 1 分。	1	1
					①项目有经审核的绩效目标表；得 0.5 分			
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 0.5 分			
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；得 0.5 分			
					④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；得 0.5 分			
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目绩效目标与项目计划数相对应，但数量指标仅设置“涉及安全项目个数”指标，未设置支付往年工程款项目数量以及 2021 年新建项目数量，不够明确细化，成本指标以预算数直接列示，未进行细化。	2	1
					①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 1 分			
					②项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；得 1 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
	资金投入（10分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得1分	该指标扣2分，得1分。		5
					评价要点：	该项目预算由吉木萨尔县住建局编制预算草案，由县财政局进行审核，提出修改意见，最后由县人大批准预算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，该指标得5分		
					①预算编制经过科学论证；得1分			
					②预算内容与项目内容匹配；得1分			
					③预算额度测算依据充分，按照标准编制；得1分			
		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；得2分	吉木萨尔县住房和城乡建设局依据多家施工方的申请将125万元分配到9个项目上，与批复的预算额度和实际情况相符。资金分配依据充分，资金分配额度合理，且与项目实际相适应。该指标得5分。		5			
		资金分配合理性				5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：
								①预算资金分配依据充分；得3分
								②预算资金分配与补助单位或地方实际相适应；得2分
过程	资金管	资金到位	5	实际到位资金与预算	评价要点：	该项目预算资金125万元，截至2021年12月31		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
(20分)	理(15分)	率		资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金及时到位；得5分	日，资金到位125万元，资金到位率100%。该指标得5分。		
					②资金未及时到位但未影响项目进度；得3分			
					③资金未及时到位并影响项目进度；得0分			
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点：	该项目预算资金125万元。截至2021年12月31日，资金执行125万元，预算执行率100%。该指标得5分。		5
					①预算资金按计划进度执行；得2分 ②截至2021年12月31日预算执行率100%；得3分。不足100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=(实际支出金额/实际到位预算金额)×100%。			
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，未发现违规使用情况。该指标得5分。		5
					①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得1分 ②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得1分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分			
					④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 2 分			
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	通过查看《吉木萨尔县住房和城乡建设局财务管理制度》《吉木萨尔县住房和城乡建设局“三重一大”决策制度》等制度文件，住建局财务管理制度健全，为项目资金支付和重大项目决策、大额资金使用提供了保障，未见政府采购制度、项目管理制度和预算绩效业务管理制度。该指标扣 1 分，得 1 分。	1	1
					①项目已制定或具有相应的财务管理制度和项目管理制度，且制度合法、合规、完整；得 1 分			
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	②项目已制定或具有相应的预算绩效业务管理制度和政府采购制度，且制度合法、合规、完整；得 1 分	吉木萨尔县住建局依据《吉木萨尔县住房和城乡建设局财务管理制度》《吉木萨尔县住房和城乡建设局“三重一大”决策制度》等制度文件对该项目进行财务和项目管理，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。部分项目未按照合同及时支付资金，该指标扣 1 分，得 2 分。	1	2
					③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得 0.5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档；得 0.5 分			
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①实际完成率 100%，得 10 分；按照完成比例×该指标权重分值计算。	根据住建局提供的 9 个项目的审计和审核报告以及盖章资料显示：9 个项目均已完工，125 万工程款已支付完成，实际完成数量和合同一致，实际完成率 100%，得 10 分。 综上，产出数量指标得 10 分。		10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指	评价要点： ①工程质量或购置物品合格率达到 100%，得 10 分；不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。	根据住建局提供的项目资料，其中项目 6 和项目 9 无验收单，占 9 个项目的比重为 22.22%，按比例扣分，该指标扣 2.22 分，得 7.78 分。 综上，产出质量指标得 7.78 分。	2.22	7.78

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				标值。				
	产出时效（10分）	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： ①完工及时率或资金及时支付率达 100%，得 10 分；不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	根据住建局提供的项目资料，包括 9 个审计和审核报告、资金支付凭证显示：工程及时完工，部分项目未按照合同及时支付资金，该指标扣 3 分，得 7 分。 综上，产出时效指标得 7 分。	3	7
	产出成本（10分）	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： ①实际成本≤计划成本（分值 10 分，得分 10 分），实际成本每高出计划成本 1%，扣 1 分，扣完为止。	该项目实际成本共计 125 万元，与预算数 125 万元相比节约 0 万元，实际成本等于计划成本，未超出预算金额。得 10 分。 综上，产出成本指标得 10 分。		10
效益	项目效	社会效益	10	项目实施所产生的社	评价要点：	评价小组通过发放“吉木萨尔县住房和城乡建设局	0.81	9.19

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
(20分)	益(20分)			会效益。	①根据项目实际产生的社会效益：保障市政基础设施安全正常运行的印证资料，结合满意度调查问卷，回复情况为比较满意、不满意或非常满意的，得10分，为不满意或非常不满意的，按照问卷调查的份数扣减相应分值，则按照 $10 - (\text{不满意比例} \times \text{该指标权重分值})$ 计算	市政安全维护资金项目满意度调查问卷”，对项目保障市政基础设施安全正常运行，提高基础设施的综合利用率，改善城市安全指数，提升县城居民生活幸福感进行调查分析，评价项目实施产生的社会效益，评价小组共收回100份问卷，其中1份为无效问卷，剩余99份问卷中：15份问卷满意度为非常满意、44份为满意、32份为比较满意、8份为不满意，未见非常不满意情况。按照不满意所占比例扣分，扣 $(8/99 \times 100\%) \times 10 = 0.81$ 分，得9.19分。综上，社会效益指标得9.19分。		
		满意度	10	受益群众满意度对项目实施效果的满意程度。	<p>评价要点：</p> <p>①按照“住房和城乡建设局市政安全维护资金项目满意度调查问卷”第5题的测算回复情况，满意度 = $\sum \text{样本数}(\text{“非常满意”} \times 1.0 + \text{“满意”} \times 0.9 + \text{“比较满意”} \times 0.6 + \text{“不满意”} \times 0.4 + \text{“非常不满意”} \times 0) / \text{总样本数} \times 100\%$。满意度为100%得满分；不足100%，则该指标得分 = 满意度 × 该指标权重分值；满意度40%以下，不得分。</p>	评价小组通过发放“住房和城乡建设局市政安全维护资金项目满意度调查问卷”，对受益群众满意度进行调查分析，评价小组共发放100份问卷，收回的100份中其中1份为无效问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、90%、60%、40%、0%，按照调查问卷中第5题的回复情况及满意度计算公式得知，受益群众满意度为75.9%，即 = $(13 \times 1.0 + 39 \times 0.9 + 41 \times 0.6 + 6 \times 0.4) / 99 \times 100\%$ ，满意度不足100%，扣2.41分，得7.59分。综上，满意度指标指标得7.59分。	2.41	7.59

一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终 得分
总分			100				13.44	86.56

附件 2：市政安全维护资金项目明细表

序号	年度	项目名称	建设内容	施工方	项目类型	开工时间	完工/验收时间	合同价	审计单位	审计价	已支付	未支付	本次支付
1	2018 年	吉木萨尔县城消防设施维护保养安装工程	①人工清理、保养消防栓共计 186 个，安装 DN200 电熔套管 20 个。 ②更换消防井盖(球墨铸铁) 16 个，安装消防标识牌 29 个，安装消火栓共计 27 个。 ③砌筑消防井 13 座安装、迁移消防水鹤 2 组等工程内容。	吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司	政府采购	2018/8/15	2018/8/30	38.17	新疆韵德恒益工程项目管理咨询有限公司	37.92	36.9	1.02	1.02
2	2019 年	吉木萨尔县满城路安装道路硬隔离栏	满城路道路硬隔离栏安装	新疆昌吉市政建设(集团)有限公司	政府采购	2019/2/2	2019/2/16	131.14	新疆宏昌建设工程有限公司	78.258	70.79	7.468	7.468
3	2019 年	东关街历史街区围挡修复项目	东关街历史街区围挡修复	新疆瑞丰恒艺广告有限公司	政府采购	2019/7/1	2019/7/14	17	新疆久一建设工程管理咨询公司	17.01	5.10	11.91	11.91
4	2019 年	吉木萨尔县环岛安装交通信号灯项目	信号灯、安装、调试、售后维修	新疆隆河市政工程有限公司	政府采购	2020/1/1	2020/3/31	27.872	新疆垚森工程造价咨询有限公司	27.872	10	17.872	17.872

5	2020 年	吉木萨尔县 2020 年道路路灯维修工程	道路路灯维修	扬州市松佳照明电器有限公司	政府采购	2020/10/30	2020/12/30	26.682	新疆正昊建设工程有限公司项目管理公司	30.0665	8.01	22.0565	22.0565
6	2021 年	吉木萨尔县 5 岔环岛路口新增红绿灯工程	5 岔环岛路口新增红绿灯安装	新疆东方恒元信息技术有限公司	政府采购	2021/1/27	2021/5/10	23.6	新疆正祥建设工程有限公司管理咨询公司	23.6	0	23.6	13.6
7	2021 年	2021 年北庭商贸城门口防撞花箱项目	50 套铁艺防撞花箱送货安装	新疆华庭工贸有限公司	政府采购	2021/11/26	2021/12/7	8.5	无需审计	0	0	8.5	8.5
8	2021 年	吉木萨尔县市政公共配套设施维护项目-消防设施维护	吉木萨尔县城内消防栓、消防水鹤及消防井维护等	吉木萨尔县竣泰市政工程有限公司	政府采购	2020/4/22	2021/4/21	42.7	新疆垚森工程造价咨询有限公司	41.2	12.7	28.5	27.522
9	2021 年	2021 年县城公共区域新增停车位标示线	县城公共区域新增停车位标示线	吉木萨尔县竣泰市政工程有限公司	政府采购	2021/6/12	2021/7/12	19.88				19.88	15.0515
金额合计：													125

附件 3：满意度调查结果分析

满意度调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为吉木萨尔县人民群众。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对住房和城乡建设局市政安全维护资金项目的受益群众进行问卷调查；在吉木萨尔县住建局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取发放纸质问卷调查方式，回收有效问卷共计 100 份。

二、满意度计算模型

满意度 = \sum 样本数 (“非常满意” $\times 1.0$ + “满意” $\times 0.9$ + “比较满意” $\times 0.6$ + “不满意” $\times 0.4$ + “非常不满意” $\times 0$) / 总样本数 $\times 100\%$

三、调查结果分析

1. 您是否了解吉木萨尔县住建局市政安全维护项目？

A：了解

B：不太了解

C：不了解

根据问卷统计结果显示，79.21%的被调查对象表示了解吉木萨尔县住建局市政安全维护项目，18.81%表示自己不太了解，1.98%表示不了解。

2.您是否见过有工作人员对消防栓或消防井进行维护？

A：是

B：否

根据问卷统计结果显示，99%的被调查对象见过有工作人员对消防栓或消防井进行维护，1%没有见过。

3.您是否见过东关街历史街区围挡修复或环岛安装红绿灯？

A：是

B：否

根据问卷统计结果显示，93.07%的被调查对象见过东关街历史街区围挡修复或环岛安装红绿灯，6.93%没有见过。

4.您对项目实施后带来的社会效益（保障市政基础设施安全正常运行，提高基础设施的综合利用率，改善城市安全指数，提升县城居民生活幸福感）的满意程度？

A：非常满意

B：满意

C：比较满意

D：不满意

E：非常不满意

根据问卷统计结果显示，15.15%的受益群体表示对本项目非常满意，44.44%表示满意，32.32%表示比较满意，8.08%表示不满意。

5.您作为本项目的受益群体，对本项目的满意程度？

A：非常满意

B：满意

C：比较满意

D：不满意

E：非常不满意


评价小组通过发放“住房和城乡建设局市政安全维护资金项目满意度调查问卷”，对受益群众满意度进行调查分析，评价小组共收回 99 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照调查问卷中第 5 题的回复情况及满意度计算公式得知，受益群众满意度为 75.9%，即= $(13 \times 1.0 + 39 \times 0.9 + 41 \times 0.6 + 6 \times 0.4) / 99 \times 100\%$ 。

附件 4：现场勘查调研

(1) 环岛红绿灯



(2) 公共区域停车位标示线

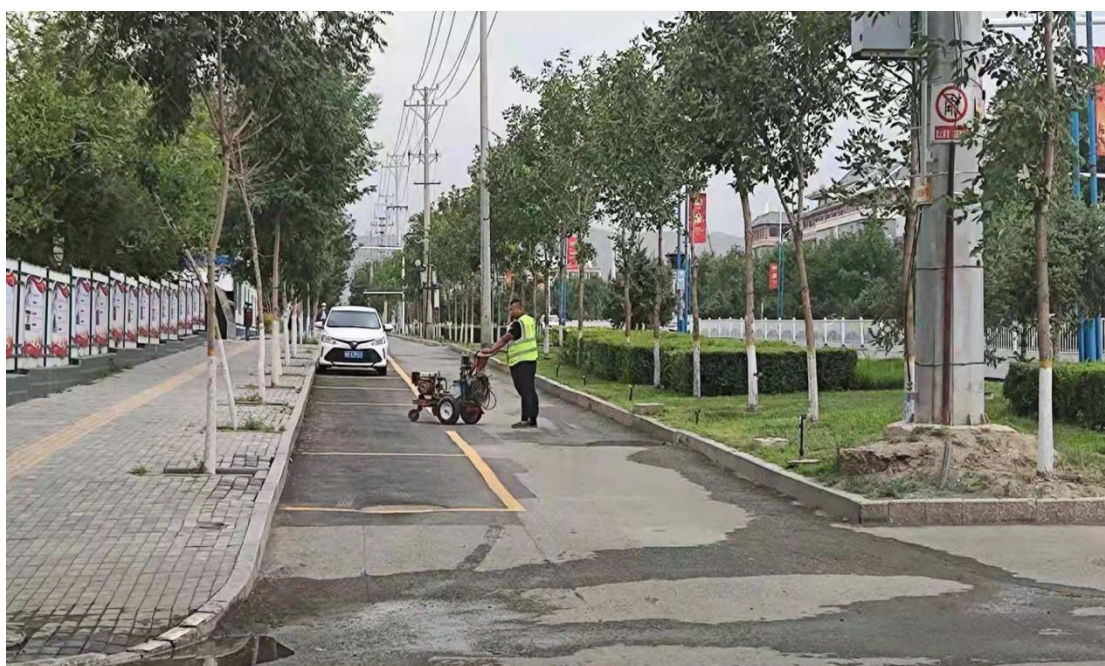

(3) 消防水鹤、消火栓

